

AMPLIACION DE CONTRATO

En Montevideo, el día 09 de mayo de 2018, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; POR OTRA PARTE: **EDUARDO MARTINEZ S.A.** (en adelante "el contratista"), representada en este acto por el Sr. Eduardo Martinez, titular de la cédula de identidad número 1.418.376-5, constituyendo domicilio en Bulevar Artigas 1659 escritorio 301 de esta ciudad; **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° M/68 para la ejecución de la obra "Mantenimiento Vial – Circuito Florida Sur – Este, Rutas 12 y 94", habiéndose recibido las ofertas el día 22 de diciembre de 2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado del Directorio del día 12 de mayo de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa Eduardo Martínez S.A. suscribiéndose contrato el 30 de mayo de 2017.
- II) Por expediente N° 4489/2017 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describirán en el Objeto del presente Contrato, así como en los Anexos que forman parte del mismo.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 04 de abril de 2018 el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan ampliar el contrato, para continuar con las tareas de **Bacheo y Rehabilitaciones parciales en las Rutas 12 y 94**, de acuerdo con los metrajes del Anexo I de este contrato que se agrega y forma parte del mismo.

TERCERO – PRECIO

El precio básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos doce millones ochenta y ocho mil ciento ochenta con 76/100) \$12:088.180,76** de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de este contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible de jornales a valores básicos es de **(pesos uruguayos un millón seiscientos dieciocho mil novecientos sesenta y siete con 66/100) \$1:618.967,66**.

QUINTO – PLAZO

Se amplía en cinco (5) meses el plazo del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

SEXTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 30 de mayo de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

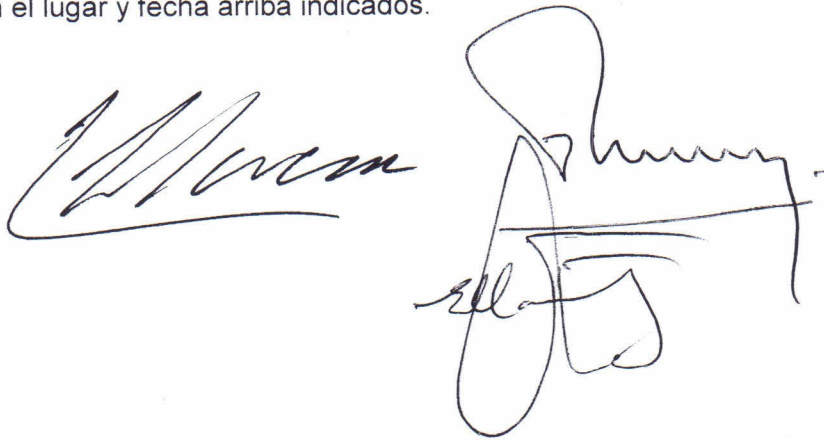
NOVENO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive name that appears to be 'A. M. ...'. The signature on the right is more complex and stylized, possibly representing a name like 'J. ...' or 'M. ...'. Both signatures are written in a fluid, connected style.

ANEXO I

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'M' or 'N'. The second is a more complex, angular signature. The third is a signature that appears to start with a large 'D' or 'O'.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitacion M/68 "Mantenimiento Vial Circuito Florida Sur Este Rutas 12 y 94"

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PU sin Impuestos \$	PU con Impuestos \$	IMPORTE \$
I	1	MOVILIZACION	Global	1,00	388.071,11	473.446,75	388.071,11
II	25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	43.400,00	45,00	54,90	1.953.000,00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	388.071,11	473.446,75	388.071,11
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	49.720,00	16,00	19,52	795.520,00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	46.720,00	32,00	39,04	1.495.040,00
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	1.264,00	750,00	915,00	948.000,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	934,00	1.650,00	2.013,00	1.541.100,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00	63.600,54	77.592,66	63.600,54
LXIX	667	PASOS A NIVEL	M	10,00	34.000,00	41.480,00	340.000,00
LXXX	912	ALIMENTACION	Pers.Mes	7,50	37.000,00	45.140,00	277.500,00
CLIII	2.136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	54,69	25.800,00	31.476,00	1.411.002,00
CLIV	2.138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	M3	102,78	24.200,00	29.524,00	2.487.276,00
							12.088.180,76

ANEXO II

Handwritten marks and signatures, including a stylized signature at the top right, a vertical mark on the left, and a signature below the top right mark.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitacion M/68 "Mantenimiento Vial Circuito Florida Sur Este Rutas 12 y 94"
 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN % DEL MES 1 AL 5

RUBRO	DENOMINACION	METRAJE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
1	MOVILIZACION	1	50	0	0	50	0
25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	43.400	20	20	20	30	0
71	RECUPERACION AMBIENTAL	1	20	20	20	20	20
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	49.720	10	20	20	30	10
113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	46.720	10	20	20	30	10
135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	1.264	20	20	20	30	0
211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	934	10	20	20	30	10
382	SEÑALIZACION DE OBRA	1	20	20	20	20	20
667	PASOS A NIVEL	10	0	30	30	20	20
912	ALIMENTACION	8	20	20	20	20	20
2136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	55	10	20	20	30	10
2138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	103	10	20	20	30	10

Handwritten signature and initials in blue ink, located to the right of the table.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitacion M/68 "Mantenimiento Vial Circuito Florida Sur Este Rutas 12 y 94"
FLUJO DE FONDOS EN \$ DEL MES 1 AL 5

RUBRO	DENOMINACION	PRECIO	METRAJE	IMPORTE	MES				
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
1	MOVILIZACION	388,071	1,00	388,071	194.035,56	-	194.035,56	-	-
25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	45	43.400,00	1.953,000	390.600,00	390.600,00	585.900,00	585.900,00	-
71	RECUPERACION AMBIENTAL	388,071	1,00	388,071	77.614,22	77.614,22	77.614,22	77.614,22	77.614,22
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	16	49.720,00	796,520	159.104,00	159.104,00	238.656,00	238.656,00	79.552,00
113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	32	46.720,00	1.495,040	149.504,00	149.504,00	448.512,00	448.512,00	149.504,00
135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	750	1.264,00	948,000	189.600,00	189.600,00	284.400,00	284.400,00	-
211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	1.650	934,00	1.541,100	154.110,00	308.220,00	462.330,00	462.330,00	154.110,00
382	SEÑALIZACION DE OBRA	63,601	1,00	63,601	12.720,11	12.720,11	12.720,11	12.720,11	12.720,11
667	PASOS A NIVEL	34,000	10,00	340,000	-	102.000,00	102.000,00	68.000,00	68.000,00
912	ALIMENTACION	37,000	7,50	277,500	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
2136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	25,800	54,69	1.411,002	141.100,20	282.200,40	423.300,60	423.300,60	141.100,20
2138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA MODIFICADA	24,200	102,78	2.487,276	248.727,60	497.455,20	746.182,80	746.182,80	248.727,60
					1.693.063,69	2.374.021,93	3.631.151,29	3.403.115,73	986.828,13

(Handwritten signatures and initials)
