

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 21 de agosto de 2019, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo Puppo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** El Sr. José Ignacio Cujó, titular de la cédula de identidad N° 3.909.261-6, actuando en nombre y representación de la empresa **JOSÉ CUJO S.A** (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en la calle Rivera 1278 (Salto), **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° C/71 para la ejecución de obra “Ruta No. 2, Tramo: 158Km000 – Cardona”, habiéndose recibido las ofertas el día 28/09/2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado por resolución del Directorio del día 25 de enero de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa José Cujó S.A. y se suscribió contrato a esos efectos el día 07 de febrero de 2017.
- II) Por expediente N° 1569/2017, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación y ampliación del contrato de la obra C/71: “Ruta No. 2, Tramo: 158Km000 – Cardona”. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 14 de diciembre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación y Ampliación de Contrato solicitada, suscribiéndose el mismo, el día 26 de abril de 2018.
- III) Por expediente N° 1881/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación de contrato, para la ejecución de los trabajos definidos en el contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de octubre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Ampliación de contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 28 de noviembre de 2018.
- IV) Por expediente N° 902/2019, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación de contrato, para la ejecución de los trabajos definidos en el objeto del presente contrato.
- V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de julio de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Ampliación de contrato correspondiente

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de realizar:

- *Mejora del área de desagüe en la alcantarilla del 167km60 de ruta 2, mediante la colocación de una batería de caños adicionales.*
- *Ejecución de mezcla asfáltica como refuerzo en banquetas en zonas interiores de curvas y de detención de ómnibus, así como también accesos a caminos departamentales del tramo.*
- *Reconstrucción de ciclovia en 1.600m en la zona de By Pass a ejecutarse de Florencio Sánchez.*
- *Alargue de tercera vía existente en 800m lineales.*

Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

El monto básico de la presente ampliación de Contrato es de **\$28:213.156,20 (pesos uruguayos veintiocho millones doscientos trece mil ciento cincuenta y seis con**

20/100) sin impuestos, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo de los trabajos de la presente ampliación es de tres (3) meses, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este Contrato.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE

La presente ampliación de Contrato implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del Contrato de **\$3:481.438,07 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho con 07/100)** sin impuestos.

SEXTO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

A partir de la presente Ampliación de Contrato, se establece un período de conservación de 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras. Dicho período se extenderá en caso de existir defectos.

SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 07 de febrero de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


NOVENO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO – NO OBJECCION DEL CONCEDENTE


Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

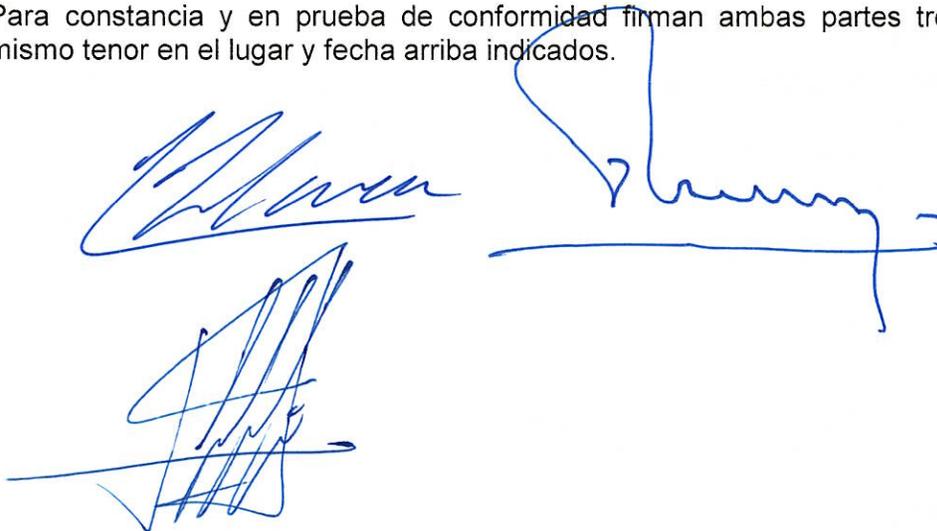Three handwritten signatures in blue ink are visible. The top signature is a cursive name, possibly 'C. Linares'. Below it is another signature, and to the right is a larger, more stylized signature. A horizontal line is drawn across the bottom of the signatures.

ANEXO I





CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

C/71-RUTA N°2 - TRAMO 158 Km 000 - 181 Km 000

Rubrado y precios

| Grupo | Rubro | Denominación | Un. | Metraje | PRECIO | |
|-------|-------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| | | | | | Unitario | Total |
| V | 101 | Mezcla asfáltica para base negra | ton | 4040,00 | 1243,00 | \$ 5.021.720,00 |
| V | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | ton | 4474,00 | 1368,00 | \$ 6.120.432,00 |
| VI | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 | 18821,00 | 7,00 | \$ 131.747,00 |
| VI | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 | 35242,00 | 7,00 | \$ 246.694,00 |
| XXXIV | 606 | Refugio Peatonal | Un. | 1,00 | 158408,83 | \$ 158.408,83 |
| CLII | 2134 | Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | ton | 442,73 | 18200,00 | \$ 8.057.686,00 |
| CLIV | 2135 | Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 | 17,62 | 20120,00 | \$ 354.514,40 |
| CLIII | 2136 | Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 | 22,59 | 21761,00 | \$ 491.580,99 |
| XIII | 277 | Alcantarillas de caños de hormigón armado de 1200cm (sin cabezales) | m | 125,00 | 18314,00 | \$ 2.289.250,00 |
| XIII | 281 | Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños | m3 | 18,00 | 14147,00 | \$ 254.646,00 |
| II | 6 | Excavación no clasificada | m3 | 1790,33 | 137,00 | \$ 245.275,21 |
| II | 7 | Excavación no clasificada a depósito | m3 | 4288,11 | 111,00 | \$ 475.980,21 |
| II | 8 | Excavación no clasificada de préstamo | m3 | 6933,45 | 275,00 | \$ 1.906.698,75 |
| VII | 129 | Base granular CBR ≥ 40 % (con transp.) | m3 | 3294,00 | 324,00 | \$ 1.067.256,00 |
| VII | 131 | Base granular CBR ≥ 60 % (con transp.) | m3 | 3015,97 | 373,00 | \$ 1.124.956,81 |
| XXXIV | 551 | Mat. est. gran. CBR ≥ 80% (Trit. c/transp.) | m3 | 330,00 | 807,00 | \$ 266.310,00 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| TOTAL | \$ 28.213.156,20 |
|--------------|-------------------------|

ANEXO II





CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
C/71-RUTA N°2 - TRAMO 158 Km 000 - 181 Km 000
PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PDT)

Cronograma

| Grupo | Rubro | Denominación | Un. | Metrage | PRECIO | | MIES 1 | MIES 2 | MIES 3 |
|--------------|-------|---|-----|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | Unitario | Total | | | |
| V | 101 | Mezcla asfáltica para base negra | ton | 4040,00 | \$ 1.243,00 | \$ 5.021.720,00 | 20% | 40% | 40% |
| V | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | ton | 4474,00 | \$ 1.368,00 | \$ 6.120.432,00 | 20% | 40% | 40% |
| VI | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 | 18821,00 | \$ 7,00 | \$ 131.747,00 | 50% | 50% | |
| VI | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 | 35242,00 | \$ 7,00 | \$ 246.694,00 | 20% | 40% | 40% |
| XXXIV | 606 | Refugio Peatonal | Un. | 1,00 | \$ 158.408,83 | \$ 158.408,83 | 100% | | |
| CLII | 2134 | Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | ton | 442,73 | \$ 18.200,00 | \$ 8.057.686,00 | 20% | 40% | 40% |
| CLIV | 2135 | Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 | 17,62 | \$ 20.120,00 | \$ 354.514,40 | 20% | 40% | 40% |
| CLIII | 2136 | Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 | 22,59 | \$ 21.761,00 | \$ 491.580,99 | 50% | 50% | |
| XIII | 277 | Alcantarillas de caños de hormigón armado de 1200cm (sin cabezales) | m | 125,00 | \$ 18.314,00 | \$ 2.289.250,00 | 100% | | |
| XIII | 281 | Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños | m3 | 18,00 | \$ 14.147,00 | \$ 254.646,00 | 100% | | |
| II | 6 | Excavación no clasificada | m3 | 1790,33 | \$ 137,00 | \$ 245.275,21 | 100% | | |
| II | 7 | Excavación no clasificada a depósito | m3 | 4288,11 | \$ 111,00 | \$ 475.980,21 | 100% | | |
| II | 8 | Excavación no clasificada de préstamo | m3 | 6933,45 | \$ 275,00 | \$ 1.906.698,75 | 100% | | |
| VIII | 129 | Base granular CBR ≥ 40 % (con transp.) | m3 | 3294,00 | \$ 324,00 | \$ 1.067.256,00 | 100% | | |
| VII | 131 | Base granular CBR ≥ 60 % (con transp.) | m3 | 3015,97 | \$ 373,00 | \$ 1.124.956,81 | 100% | | |
| XXXIV | 551 | Mat. est. gran. CBR ≥ 80% (Trit. c/trans.) | m3 | 330,00 | \$ 807,00 | \$ 266.310,00 | 100% | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 28.213.156,20 | | | |



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
C/71-RUTA N°2 - TRAMO 158 Km 000 - 181 Km 000
PLAN DE FLUJO DE FONDOS (PFF) - (PESOS BÁSICOS)

Flujo de Fondos

| Grupo | Rubro | Denominación | Un. | Metrage | PRECIO | |
|--------------|-------|---|-----|----------|---------------|-------------------------|
| | | | | | Unitario | Total |
| V | 101 | Mezcla asfáltica para base negra | ton | 4040,00 | \$ 1.243,00 | \$ 5.021.720,00 |
| V | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | ton | 4474,00 | \$ 1.368,00 | \$ 6.120.432,00 |
| VI | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 | 18821,00 | \$ 7,00 | \$ 131.747,00 |
| VI | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 | 35242,00 | \$ 7,00 | \$ 246.694,00 |
| XXXIV | 606 | Refugio Peatonal | Un. | 1,00 | \$ 158.408,83 | \$ 158.408,83 |
| CLII | 2134 | Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | ton | 442,73 | \$ 18.200,00 | \$ 8.057.686,00 |
| CLIV | 2135 | Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 | 17,62 | \$ 20.120,00 | \$ 354.514,40 |
| CLIII | 2136 | Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 | 22,59 | \$ 21.761,00 | \$ 491.580,99 |
| XIII | 277 | Alcantarillas de caños de hormigón armado de 1200cm (sin cabezales) | m | 125,00 | \$ 18.314,00 | \$ 2.289.250,00 |
| XIII | 281 | Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños | m3 | 18,00 | \$ 14.147,00 | \$ 254.646,00 |
| II | 6 | Excavación no clasificada | m3 | 1790,33 | \$ 137,00 | \$ 245.275,21 |
| II | 7 | Excavación no clasificada a depósito | m3 | 4288,11 | \$ 111,00 | \$ 475.980,21 |
| II | 8 | Excavación no clasificada de préstamo | m3 | 6933,45 | \$ 275,00 | \$ 1.906.698,75 |
| VII | 129 | Base granular CBR ≥ 40 % (con transp.) | m3 | 3294,00 | \$ 324,00 | \$ 1.067.296,00 |
| VII | 131 | Base granular CBR ≥ 60 % (con transp.) | m3 | 3015,97 | \$ 373,00 | \$ 1.124.956,81 |
| XXXIV | 551 | Mat. est. gran. CBR ≥ 80% (Trit. c/trans.) | m3 | 330,00 | \$ 807,00 | \$ 266.310,00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 28.213.156,20 |

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | \$ 1.004.344,00 | \$ 2.008.688,00 | \$ 2.008.688,00 |
| | \$ 1.224.086,40 | \$ 2.448.172,80 | \$ 2.448.172,80 |
| | \$ 65.873,50 | \$ 65.873,50 | \$ 0,00 |
| | \$ 49.338,80 | \$ 98.677,60 | \$ 98.677,60 |
| | \$ 158.408,83 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 1.611.537,20 | \$ 3.223.074,40 | \$ 3.223.074,40 |
| | \$ 70.902,88 | \$ 141.805,76 | \$ 141.805,76 |
| | \$ 245.790,50 | \$ 245.790,50 | \$ 0,00 |
| | \$ 2.289.250,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 254.646,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 245.275,21 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 475.980,21 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 1.906.698,75 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 1.067.296,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 1.124.956,81 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| | \$ 266.310,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| PARCIAL | \$ 12.060.655,09 | \$ 8.232.082,56 | \$ 7.920.418,56 |
| ACUMULADO | \$ 12.060.655,09 | \$ 20.292.737,64 | \$ 28.213.156,20 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 43% | 29% | 28% |
|-----|-----|-----|
